


NO.4



新庁舎建設工事進捗状況


地下躯体工事(柱壁筋組立・型枠建込)の様子

地下の柱壁筋組み立ておよび、型枠の組み立てを行いました。型枠はコンクリートを成型するために必要になります。写真左上は、柱壁筋組み立ての様子です。写真下は型枠になります。型枠が終わり次第、次の配筋工事(スラブ配筋)に入ります。

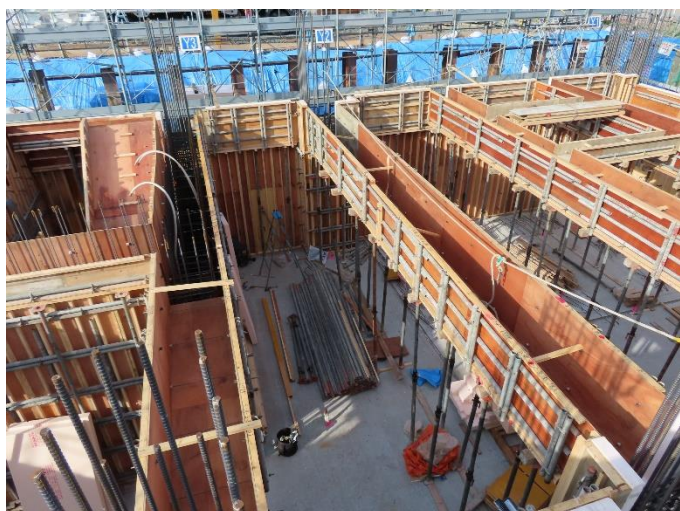

地下躯体工事 (スラフ配筋・配管・スリーブ・コンクリート打設)の様子

梁、スラフ配筋および配管、スリーブの取り付け、地下躯体コンクリート打設を行いました。
写真上は、配筋および配管取り付けをしたものです。左下の写真は スリーブという給排水
管などの配管を通すための開口を確保するための管の取り付けをしたものです。
右下の写真は、コンクリート打設後の様子です。

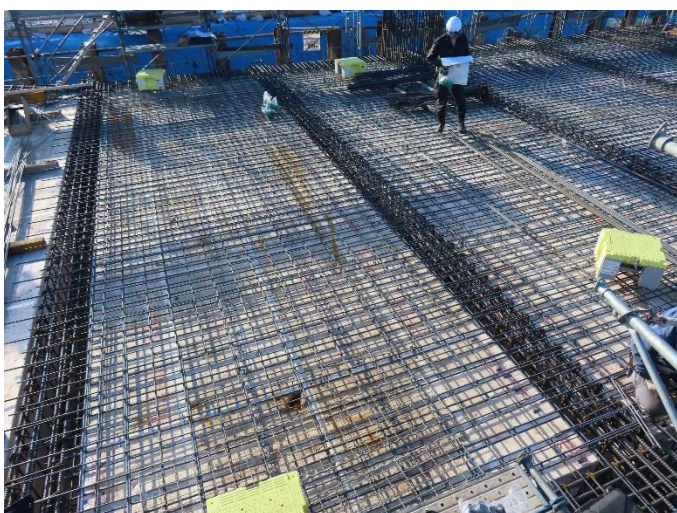

置換工事の様子

杭工事を行う準備として置換工事を行いました。

置換工事とは、杭を打つ箇所の土を取り除き、良質な土に置き換える工事です。

下の写真は、元の土を取り除いている様子です。

1月中旬まで置換工事を行い、1月下旬頃から杭の打ち込みを始める予定です。



工事中、工事車両等の出入りにご注意ください。

発行：建設課庁舎整備係 TEL0136-44-2121 / 発行日：令和元年(2019年)12月25日
