


NO.6



# 新庁舎建設工事進捗状況

## 山留引き抜き& 1階基礎土工事 (掘削・敷砂利・捨てコン打設)

基礎を作るため、打ち込んでいた山留を引き抜き(写真左上)、根切り(以下、掘削)を行いました(写真右上)。掘削後、敷砂利・捨てコンの打設を行いました(写真下)。

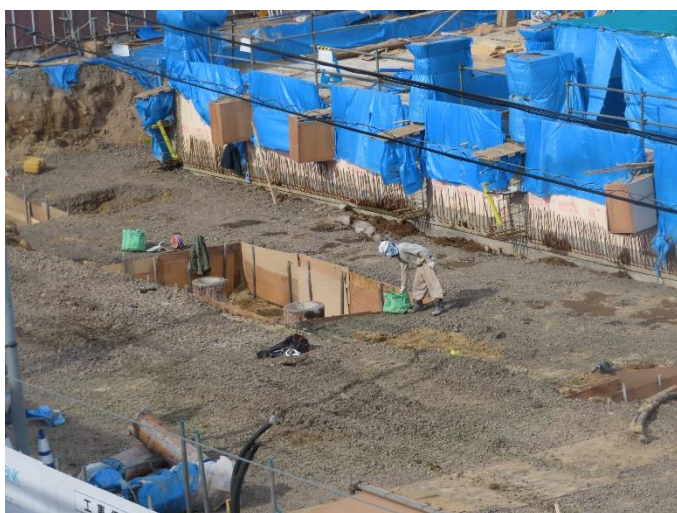



## 杭頭補強筋・ベース筋・コンクリート打設

杭頭に補強筋を溶接しました(写真左上)。その後、ベース配筋・コンクリートの打設を行いました(写真右上)。

※杭頭補強筋・・・杭と建物(基礎)を一体とするために必要な鉄筋

※ベース配筋・・・地盤からの反力を負担するために必要な鉄筋



## 基礎配筋・耐圧盤打設(コンクリート)

基礎の配筋および耐圧盤の打設を行いました。コンクリートの量が多い場合2回に分けて打設しています。右の写真の白く写っている部分が別の日に打設したコンクリートです。






# 1階躯体工事 (スラブ配筋・配管取付・コンクリート打設)

1階のスラブ配筋(床)、配管の取付およびコンクリートの打設を行いました。

1階の床面積は地下と比べて約3倍となっており、ほとんどの課を1階に配置できるようになっています。

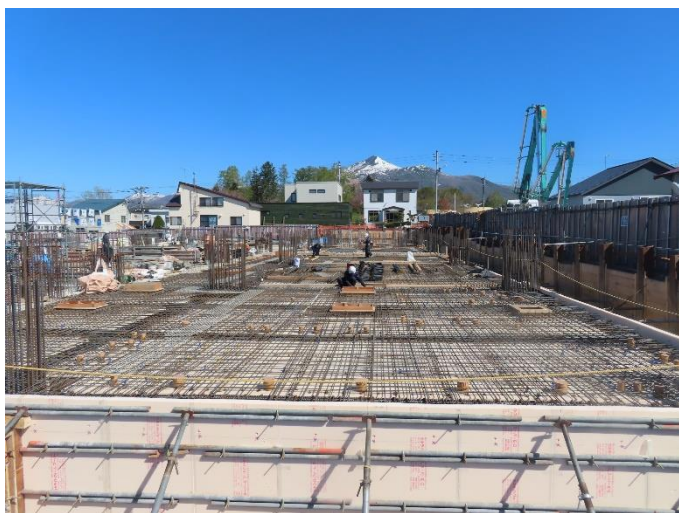

工事中、工事車両等の出入りにご注意ください。
