

北海道新幹線、羊蹄トンネル（有島）他

住民説明会資料

～事務所・宿舎（プレハブ）設置について～
（2期工事）

①事務所・宿舎について（協力業者用）

②質疑・応答

<参考>新幹線工事について

★施工者 熊谷・不動テトラ・宮坂・橋本川島
北海道新幹線、羊蹄トンネル（有島）他特定建設工事共同企業体

①事務所・宿舎について



昨年の11月に事務所・宿舎が完成し、12月から使用しています。

今回の工事は、協力業者が使用する事務所・宿舎を建設する2回目の工事計画になります。



< 施工手順 >



< 工程表 >

	4月				5月				6月				7月				
	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	
申請手続き	■																
基礎工事【ヤード整備・木杭】						■											
本体建方【柱・壁・屋根】									■								
本体内装・設備【空調・電気・給排水】									■								
完成【検査】													■				

5月中旬頃から建設工事を始める計画です。

6月中に事務所・宿舎を完成し、7月から使用する予定です。

※中学校とは随時打ち合わせを行い、中学校の行事を確認して、ご迷惑にならないよう工事します。

②質疑・応答について

質疑については、コロナウイルス感染予防のため、お手数ですが下記にあります電話番号にお電話いただくと幸いです。

担当者が質疑について対応致します。


質疑の受付期間は5月8日（金曜日）までといたします。
日曜日、祝日は休工となりますので、電話対応できません。

何卒ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

★施工者 熊谷・不動テトラ・宮坂・橋本川島
北海道新幹線、羊蹄トンネル（有島）他特定建設工事共同企業体
住所：ニセコ町字富士見162-1

連絡先0136-55-6461 担当者 吉田、秋谷

<参考> 新幹線工事について

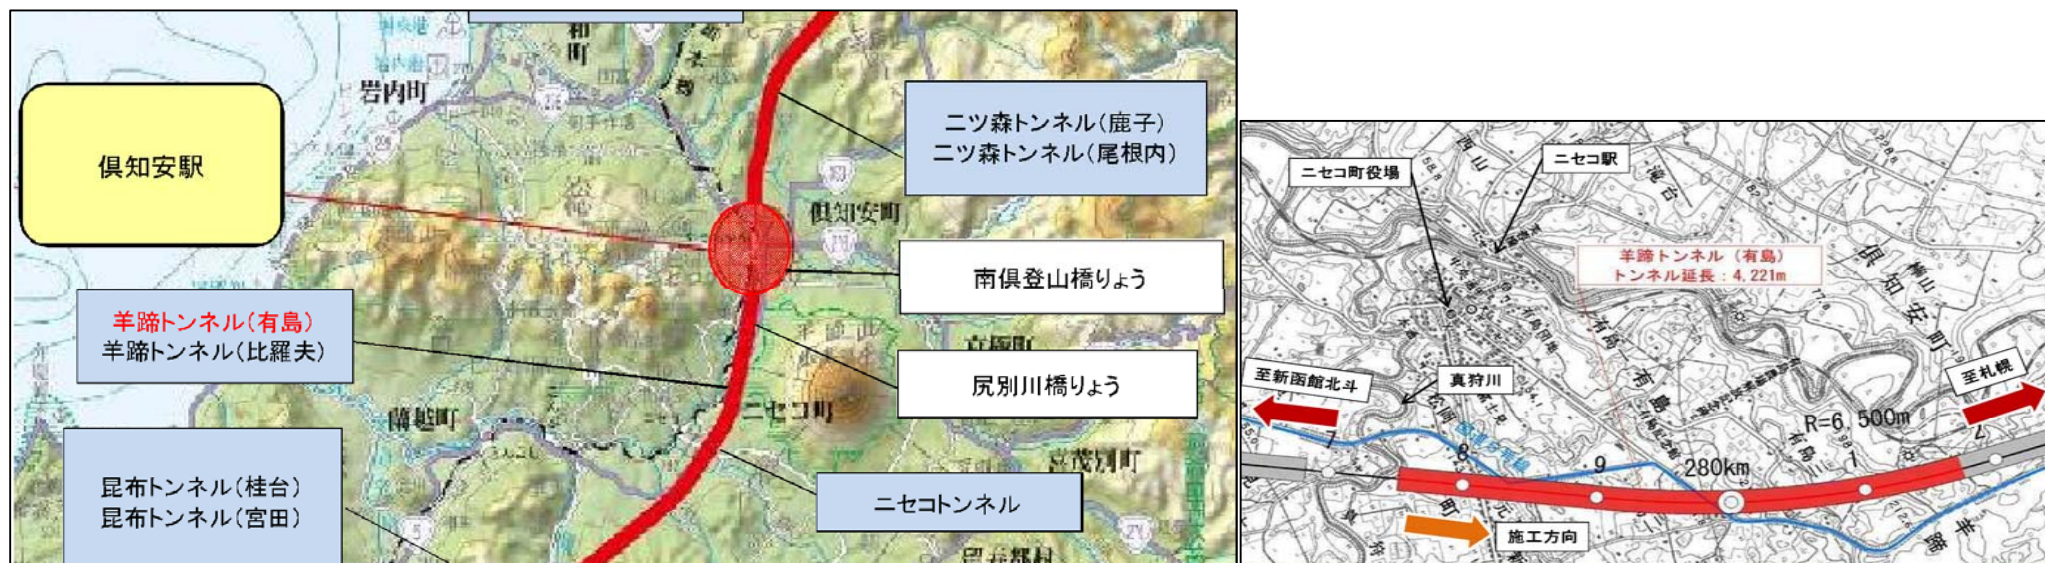

本工事は、新函館北斗～札幌間の羊蹄トンネル(有島)工区となり、俱知安駅の南方の全長9,750mの羊蹄トンネルの南側工区で、施工延長4,245mの工事になります。

工期は平成31年2月6日～令和7年3月5日になります。

<工事状況>

昨年度は、工事用道路、作業ヤード整備を行いました。

今年は、令和3年からのシールド機によるトンネル掘削を行うためのヤード整備・トンネル設備設置等の作業を進めていきます。



4月現場状況写真

<シールド機>

組立完了 令和3年夏！



【参考写真】
